

FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 1 de 14

#### INVERSIONES PRODUCTIVAS A NIVEL GENERAL E I+D

MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	PERIODO	ESTAD	O DE LA EJEC	CUCCION	D	ESVIACIONES		
MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	DE EJECUCION	PENDIENTE	EN PROCESO	FINALIZADO	CRONOLOGICAS	ECONOMICAS	SOCIALES	OBSERVACIONES
CAMARAS PLANTA FRIGO POLIGONO LA JARA	2.018-2.019							
CAMARAS PLANTA FRIGO POLIGONO LA JARA	<u>2.019-2.020</u>							
MEJORA INASTALACIONES NAVE MANIPULACION	<u>2.018-2.019</u>							
IVIEJORA INASTALACIONES NAVE IVIANIPULACION	<u>2.019-2.020</u>							
APEROS Y MAQUINARIA AGRICOLA LIGERA USO	2.018-2.019							
GENERAL	2.019-2.020							
VEHICLILOS ACDICOLAS	2.018-2.019							
VEHICULOS AGRICOLAS	2.019-2.020							
TRACTORES ACRISOLAS	2.018-2.019							
TRACTORES AGRICOLAS	2.019-2.020							
PROYECTO I+D MEJORA VARIETAL	2.018-2.019							
ROYECTO 1+D MEJORA VARIETAL	2.019-2.020							

#### **INVERSIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO DE ROCIANA**

MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	PERIODO	ESTAD	O DE LA EJEC	CUCCION	DESVIACIONES			
WIEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	DE EJECUCION	PENDIENTE	EN PROCESO	FINALIZADO	CRONOLOGICAS	ECONOMICAS	SOCIALES	OBSERVACIONES
INVERSIONES PROPILISTIVAS	2.018-2.019							
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.019-2.020							
CONTRUCCION DE COCINA - COMEDOR COMUN  REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA Y UN COMEDOR PARA EL USO DE TODOS LOS TRABAJADORES, INCLUYENDO TODOS LOS MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES NECESARIOS.	2.018-2.019					INCREMENTO DEL COSTE DEL 15.36%		



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 2 de 14


MEJORAR EL ESPACIO QUE UNE LOS DISTINTOS ALOJAMIENTOS, CON EL HORMIGONADO DEL SUELO, FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDILLAS DE PROTECCION ANTICAIDA QUE CONECTA LA ZONA DE ALOJAMIENTO CON LA ZONA DE COMEDOR COMUN.	2.018-2.019			INCREMENTO DEL COSTE DEL 5%	
MEJORAR LOS SISTEMAS DE CALEFACCION Y REFRIGERACION EN LA ZONA DE LOS ALOJAMIENTOS, CON LA INSTALACION EN LA ZONA DE LOS ALOJAMIENTOS UN ALPENDE CON LONA DE SOMBREO, EN LA ZONA DE ACCESO A LA ZONA DE COMEDOR — COCINA INTALACION DE ALPENDE DE CHAPA ONDULADA PARA SOMBREO Y ARREGLOS E INSTALACION DE LAS MAQUINAS DE FRIO — CALOR.	2.018-2.019		CUMPLIMIENTO 50% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 50%	POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS	
MEJORA EL ACCESO A LOS ALOJAMIENTOS.  MEJORA DEL ACCESO A LA FINCA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OTRO CAMINO PARA PODER SEPARAR EL TRANSITO HABITUAL DE LA FINCA CON LA ZONA DE LOS ALOJAMIENTOS. MEJORANDO LA PRIVACIDAD DE LOS ALOJADOS.	2.018-2.019		CUMPLIMIENTO 50% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 50%	POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS	
AMPLIACION DE ASEOS-DUCHAS, PARA AUMENTAR SU ACCESO CON MAYOR COMODIDAD POR LOS TRABAJADORES ALOJADOS.	2.018-2.019				
ADORNAR LOS ALREDERORES MEDIANTE EL AJARDINADO DE LOS MISMOS, MEJORAR LOS ESPACIOS DEL PERIMETRO DE LOS ALOJAMIENTOS CON LA COLOCACION DE OLIVOS, ADELFAS, ROSALES, Y PLANTAS COMO ALOEVERA, ROMERO, LAVANDA. ET	2.018-2.019		CUMPLIMIENTO DEL 70% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 30%		
<b>ILUMINACION EXTERIOR</b> , CON LA INSTALACION DE ILUMINACION CON SENSOR CREPUSCULAR.	2.018-2.019				
REALICACION DE MEJORAS EN COCINAS COMUNES ASIGNADAS POR BLOQUES DE MODULOS.  COLOCACION DE ENCIMERAS.  COLOCACION DE ZOCALO DAZULEJOS EN FRONTAL DE COCINA.  REPARACION SUSTITUCUION DE MUEBLES DE COCINA.  CAMBIO DE FREGADEROS POR UNOS CON ESCURR. DE PLATOS.	2.019-2.020			INCREMENTO DEL COSTE DEL 21.72%	
MEJORAS EN LAS COMUNICACIONES. INSTALAR Y CONFIGURAR UNA ANTENA DE WIFFI EXTERIOR DE LARGO ALCANCE E INSTALAR Y MEJORAR LA INSTALACION DE TV Y SATELITE.	2.019-2.020		CUMPLIMIENTO 50% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 50%	POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS	




FECHA: 31/07/2020

**REVISIÓN: 1** Página 3 de 14

#### **FOTOS:**

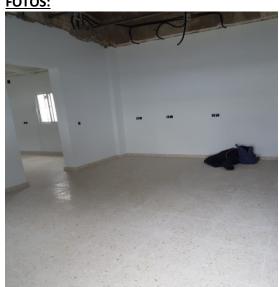

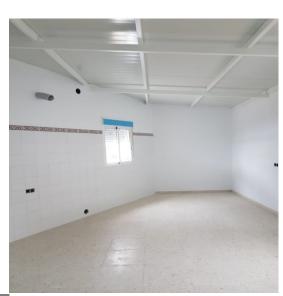

DISGREGAR LA ZONA DE COCINA – COMDOR COMUN, INTALAR INSTALACION ELECTRICA Y ALICATADO DE LAS PAREDES





FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 4 de 14

#### COLOCACION DE MUEBLES DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS Y TODOS LOS ENSERES NECESATIOS





CONSTRUCCION DE ALPENDE Y HABILITAR ZONA DE REUNION COMUN



MEJORA DEL ESPACION DE ACCESO A LA ZONA DE COMEDOR – COCINA COMUN, HABILITANDO ESTA ZONA COMO ESPACIO DE DESCANSO Y DE REALIZACION DE ACTIVIDADES.



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 5 de 14

#### INVERSIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO DE MONTEMAYOR.

	PERIODO	ESTADO	O DE LA EJEC	UCCION	DE	SVIACIONES		
MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	DE EJECUCION	PENDIENTE	EN PROCESO	FINALIZADO	CRONOLOGICAS	ECONOMICAS	SOCIALES	OBSERVACIONES
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.018-2.019							
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.019-2.020							
MEJORAR EL ESPACIO QUE UNE LOS DISTINTOS ALOJAMIENTOS, ASEOS BAÑO Y DUCHAS, CON EL HORMIGONADO DE LA ZONA QUE UNE A LOS MISMOS CREANDO UNA CALLE DE CONEXIÓN, DE REUNION PARA LAS DISTINTAS PERSONAS ALOJADAS Y PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO.	2.018-2.019					INCREMENTO DEL COSTE DEL 8%		
MEJORAR LOS SISTEMAS DE CALEFACCION Y REFRIGERACION DE LOS ALOJAMIENTOS, CON LA INSTALACION EN LA ZONA DE LOS ALOJAMIENTOS UN ALPENDE CON LONA DE SOMBREO Y LA INSTALACION DE MAQUINAS DE FRIO – CALOR.	2.018-2.019				CUMPLIMIENTO 50% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 50%			PENDIENTE CONCESION COMPAÑÍA ELECTRICIDAD DE MAS WATIOS
AISLAR LA ZONA DE TENDEDEROS, EN PRO DE PROTEGER LA INTIMIDAD DE LOS ALOJADOS DEL RESTO DE TRABAJADORES QUE ACCEDEN A LA FINCA, ESTABLECIENDO UNA ZONA PARA TENDEDEROS DELIMITADA MEDIANTE VALLADO CON LONA DE OCULTACION.	2.018-2.019							
ILUMINACION EXTERIOR, CON LA INSTALACION DE ALUMBRADO MEDIANTE ILUMINACION CON SENSOR CREPUSCULAR.	2.018-2.019							
ADORNAR LOS ALREDERORES MEDIANTE EL AJARDINADO DE LOS MISMOS, MEJORAR LOS ESPACIOS DEL PERIMETRO DE LOS ALOJAMIENTOS CON LA COLOCACION DE OLIVOS, ADELFAS, ROSALES, Y PLANTAS COMO, ROMERO, LAVANDA.	2.018-2.019				CUMPLIMIENTO DEL 70% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 30%			PENDIENTE DE PROVEEDORES DE ARBOLES
MEJORAS DE LAS DUCHAS.  AMPLIACION DE LOS TERMOS ELECTRICOS DE DUCHA, CON LA FABRICACION DE UN MODULO EQUIPADO CON DOS NUEVOS TERMOS ELECTRICOS PARA AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA CALIENTE A LAS DUCHAS.	<u>2.019-2.020</u>					INCREMENTO DEL COSTE DEL 28.51%		
MEJORAS EN LAS COMUNICACIONES. INSTALAR Y CONFIGURAR UNA ANTENA DE WIFFI EXTERIOR DE LARGO ALCANCE E INSTALAR Y MEJORAR LA INSTALACION DE TV Y SATELITE.	2.019-2.020				TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 100%	POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS		



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 6 de 14

AMPLIAR LA ZONA DE DESCANSO COMUN, CON LA					
INTEGRACION DE UN MODULO CON SERVICIO DE					
MAQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ Y RESFRERESCOS CON	2.019-2.020				
MESAS Y SILLAS. INSTALAR Y MEJORAR LA INSTALACION DE					
TV Y SATELITE.					

#### **FOTOS:**



CONSTRUCCION DE ZONA AISLADA COMUN DE TENDEDEROS Y CONSTRUCCION DE ALPENDE EN EL ESPACIO COMUN QUE COMUNICA LOS ALOJAMIENTOS. COLOCACION DE MESAS – SILLAS CREANDO UNA ZONA DE REUNION Y DE DESCANSO



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 7 de 14

#### INVERSIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO DE MOGUER.

	PERIODO	ESTADO	D DE LA EJEC	CUCCION	DE	SVIACIONES		
MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	DE EJECUCION	PENDIENTE	EN PROCESO	FINALIZADO	CRONOLOGICAS	ECONOMICAS	SOCIALES	OBSERVACIONES
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.018-2.019							
	2.019-2.020							
MEJORA DE LOS INTERIORES.  EN LOS ASEOS (SUSTITUCION DE AZULEJOS, BAÑERAS, WATER, GRIFOS)  LIMPIEZA Y PINTADO DE TODAS LAS VIVIENDAS.  SUSTITUCION DE PUERTAS.  AMPLIAR ZONA DE ALMACENAJE EN COCINA Y SUSTITUCION DE ALGUNOS ELECTRODOMESTICOS.  REPARACION Y SUSTITUCION DE TERMOS DE GAS.  SUSTITUCION DE VENTANAS E ILUMINARIA INTERIOR POR LED EMPOTRADO.  REPONER LOS ENSERES NECESRIOS, MUBLES DE COMEDOR, MESITAS DE NOCHES, CUADROS, SOFAS.  REPARACION Y SUSTITUCION DE VENTANAS, PUERTAS Y TECHOS INTERIORES.	<u>2.018-2.019</u>				CUMPLIMIENTO 70% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 30%	INCREMENTO DEL COSTE DEL 9,00% DEL 70% CUMPLIDO Y TRASLADO AL PLAN SIGUENTE POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS		
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN CONSTRUCCION DE UNA ZONA DE COMEDOR COMUN PARA LOS TRABAJADORES, CON MAQUINA DE CAFÉ, REFRESCOS MICROHONDAS, FRIGORIFICOS.	2.018-2.019							
MEJORA DE LOS ALREDEDORES DE LAS CASAS.  MEJORA DE LOS ALREDEDORES MEDIANTE LA RETIRADA DE CASCOTES Y RESTOS DE OBRAS.  NIVELACION DEL TERRENO Y COMPACTADO CON GRABA ARTIFICIAL CON RULO DE COMPACTADO.  MEJORA DE LOS ACCESOS A LOS ALOJAMIENTOS MEDIANTE UN ZOCALO DE HORMIGON EN LA PUERTA PRINCIPAL DE CADA CASA PARA EVITAR LA ENTRADA DE BARRO Y AGUA A LAS VIVIENDAS.	2.019-2.020				CUMPLIMIENTO 50% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 50%	POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS		
AUMENTAR LA PRESION DE AGUA EN LOS ALOJAMIENTOS. COLOCACION DE UN CENTRO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE.	2.019-2.020					INCREMENTO DEL COSTE DEL 29,52%		
REPARACION DE PUERTA DE ACCESO A FINCA Y ALOJAMIENTOS, A TRAVES DE LA REPARACION EN LA AUTOMATIZACION.	2.019-2.020				TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 100%	POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS		



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 8 de 14

ı	MEJORAS DE LAS COMUNICACIONES.			TRASLADO AL	POR AGOTAR	l	
	INSTALAR Y CONFIGURAR UNA ANTENA DE WIFFI EXTERIOR			TRASLADO AL	POR AGOTAR	l	
		2.018-2.019		SIGUIENTE PLAN	LAS PARTIDAS	l	
	DE LARGO ALCANCE. INSTALAR Y MEJORAR LA INSTALACION			100%	ECONOMICAS	l	
	DE TV Y SATELITE			100%	LCONOMICAS	l	

#### **FOTOS:**



MODIFICAR LAS VENTANAS EXTERIORES PARA APORTAR A LOS ALOJAMIENTOS LUZ NATURAL Y VENTILACION.



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 9 de 14

SUSTITUCION DE LAS PUERTAS DETERIORADAS...

ARREGLO DE TECHOS E ILUMINACION.



**MEJORA EN LOS ASEOS.** 

MEJORA DE LOS ALREDEDORES, PARA ELIMINAR POSIBLES HUMEDADES EN LOS LOJAMIENTOS.



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 10 de 14

#### INVERSIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO DE LUCENA.

	PERIODO	ESTADO	DE LA EJEC	CUCCION	DE	SVIACIONES		
MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	DE EJECUCION	PENDIENTE	EN PROCESO	FINALIZADO	CRONOLOGICAS	ECONOMICAS	SOCIALES	OBSERVACIONES
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.018-2.019							
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.019-2.020							
MEJORAS DE LAS COMUNICACIONES. INSTALAR Y CONFIGURAR UNA ANTENA DE WIFFI EXTERIOR DE LARGO ALCANCE. MEJORAR LA INSTALACION DE TV Y SATELITE.  MEJORA DE LOS ALREDEDORES DE LAS CASAS. RESTAURACION DE FACHADAS Y PERIMETROS Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y AJARDINADO CON ARBOLES Y	2.018-2.019 2.018-2.019							
PLANTAS  MEJORA DE LOS ACCESOS.  MEJORA DE LOS ACCESOS MEDIANTE EL NIVELADO DEL TERRENO Y EL COMPACTADO MEDIANTE ZAHORRA ARTIFICIAL	2.018-2.019					INCREMENTO DEL COSTE DEL 33,10%		

**FOTOS: NO DISPONIBLES** 



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 11 de 14

#### INVERSIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO DE CARTAYA.

	PERIODO	ESTADO	DE LA EJEC	CUCCION	DE	SVIACIONES		
MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	DE EJECUCION	PENDIENTE	EN PROCESO	FINALIZADO	CRONOLOGICAS	ECONOMICAS	SOCIALES	OBSERVACIONES
INVERSIONES PRODUCTIVAS	<u>2.018-2.019</u>							
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.019-2.020							
SE ACUERDA MEJORAR EL ESPACIO QUE UNE LOS DISTINTOS ALOJAMIENTOS, ASEOS BAÑO Y DUCHAS, CON EL HORMIGONADO DE LA ZONA QUE UNE A LOS MISMOS CREANDO UNA CALLE DE CONEXIÓN, DE REUNION PARA LAS DISTINTAS PERSONAS ALOJADAS Y PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO.	<u>2.018-2.019</u>					INCREMENTO DEL COSTE DEL 15%		
CONSTRUIR Y MEJORAR EL ACCESO A LOS ALOJAMIENTOS, MEDIANTE LA CONSTRUCCUON DE UN PASILLO DE HORMIGON HASTA LOS ACCESOS DE LOS ALOJAMIENTOS MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA MALLA DE OCULTACION EN PERIMETRO Y EMBELLECER LOS ALREDEDORES A TRAVES DEL AJARDINADO DEL PASILLO DE ENTRADA Y LA ZONA DE LOS ALREDEDORES DE LOS ALOJAMIENTOS, A TRAVES DE LA SIEMBRA DE ADELFAS, ALOEVERA, ARBOLES Y PLANTAS.	2.018-2.019					INCREMENTO DEL COSTE DEL 6,33%		
MEJORAR LOS SISTEMAS DE CALEFACCION Y REFRIGERACION DE LOS ALOJAMIENTOS, CON LA INSTALACION EN LA ZONA DE LOS ALOJAMIENTOS UN ALPENDE CON LONA DE SOMBREO Y LA INSTALACION DE MAQUINAS DE FRIO – CALOR.	2.018-2.019				CUMPLIMIENTO 50% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 50%	POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS		
AISLAR LA ZONA DE TENDEDEROS, EN PRO DE PROTEGER LA INTIMIDAD DE LOS ALOJADOS DEL RESTO DE TRABAJADORES QUE ACCEDEN A LA FINCA, ESTABLECIENDO UNA ZONA PARA TENDEDEROS DELIMITADA MEDIANTE VALLADO CON LONA DE OCULTACION.	2.018-2.019							
MEJORAR LA RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA EN LA ZONA DE LOS ALOJAMIENTOS, A TRAVES DE LA INSTALACION DE LA CANALIZACION EN EL INTERIOR DEL TERRERO DE TUBOS PARA LA RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA	2.018-2.019							
ILUMINACION EXTERIOR, CON LA INSTALACION DE ALUMBRADO MEDIANTE ILUMINACION CON SENSOR CREPUSCULAR.	2.018-2.019							



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 12 de 14

REPARACION O SUSTITUCION DE LA PUERTA DE ACCESO A FINCA Y ALOJAMIENTOS, SUSTITUIR LA PUERTA POR DETERIORO DEL USO.	<u>2.019-2.020</u>		TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 100%	POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS	
MEJORAS DE LAS DUCHAS.  AMPLIACION DE LOS TERMOS ELECTRICOS DE DUCHA, CON LA FABRICACION DE UN MODULO EQUIPADO CON DOS NUEVOS TERMOS ELECTRICOS PARA AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA CALIENTE A LAS DUCHAS.	2.019-2.020		10070	INCREMENTO DEL COSTE DEL 27%	
MEJORAS DE LAS COMUNICACIONES. INSTALAR Y CONFIGURAR UNA ANTENA DE WIFFI EXTERIOR DE LARGO ALCANCE. INSTALAR Y MEJORAR LA INSTALACION DE TV Y SATELITE.	2.019-2.020		CUMPLIMIENTO 50% TRASLADO AL SIGUIENTE PLAN 50%	POR AGOTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS	

**FOTOS:** 



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 13 de 14

#### INVERSIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO DE LEPE.

	PERIODO	ESTADO	ESTADO DE LA EJECUCCION			DESVIACIONES			
MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	DE EJECUCION	PENDIENTE	EN PROCESO	FINALIZADO	CRONOLOGICAS	ECONOMICAS	SOCIALES	OBSERVACIONES	
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.018-2.019								
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.019-2.020								

#### **INVERSIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO DE PALOS.**

	PERIODO	ESTADO DE LA EJECUCCION			DE			
MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS	DE EJECUCION	PENDIENTE	EN PROCESO	FINALIZADO	CRONOLOGICAS	ECONOMICAS	SOCIALES	OBSERVACIONES
INVERSIONES PRODUCTIVAS	<u>2.018-2.019</u>							
INVERSIONES PRODUCTIVAS	2.019-2.020							



FECHA: 31/07/2020

REVISIÓN: 1 Página 14 de 14

#### IMPORTES DE INVERSION FINAL Y COMPARATIVA CON PRESUPUESTOS INICIALES

PROYECTOS	FINAL	% FINAL	PREVISTO	% PREVISTO	DIFERENCIA	PREVISTO 18-19	FINAL 18-19	DIF. 18-19	PREVISTO 19-20	FINAL 19-20	DIF. 19-20
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA ROCIANA	106.185,21€	8,83%	105.000,00€	8,68%	1.185,21€			0,00€	105.000,00€	106.185,21€	1.185,21€
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA MONTEMAYOR	27.167,67€	2,26%	30.000,00€	2,48%	-2.832,33€	30.000,00€	27.167,67€	-2.832,33€			0,00€
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA MOGUER	35.000,26€	2,91%	30.000,00€	2,48%	5.000,26€	30.000,00€	35.000,26€	5.000,26€			0,00€
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA LUCENA	194.821,95€	16,19%	195.000,00€	16,12%	-178,05€			0,00€	195.000,00€	194.821,95€	-178,05 €
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA CARTAYA	95.968,39€	7,98%	105.000,00€	8,68%	-9.031,61€			0,00€	105.000,00€	95.968,39€	-9.031,61€
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA LEPE	130.458,55€	10,84%	135.000,00€	11,16%	-4.541,45€	70.000,00€	67.838,45 €	-2.161,55€	65.000,00€	62.620,10€	-2.379,90 €
PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS FINCA PALOS	4.677,38€	0,39%	7.500,00€	0,62%	-2.822,62€	7.500,00€	4.677,38€	-2.822,62€			0,00€
PROYECTO: CAMARAS PLANTA FRIGO POLIGONO LA JARA	135.650,47€	11,28%	160.000,00€	13,22%	-24.349,53€	160.000,00€	135.650,47€	-24.349,53€			0,00€
PROYECTO: MEJORA INASTALACIONES NAVE MANIPULACION	17.414,36€	1,45%	20.000,00€	1,65%	-2.585,64€			0,00€	20.000,00€	17.414,36€	-2.585,64 €
PROYECTO: APEROS Y MAQUINARIA AGRICOLA LIGERA USO GENERAL	65.058,85€	5,41%	60.000,00€	4,96%	5.058,85€	30.000,00€	32.529,43€	2.529,43 €	30.000,00€	32.529,43€	2.529,43 €
PROYECTO: VEHICULOS AGRICOLAS	50.966,95€	4,24%	50.000,00€	4,13%	966,95€			0,00€	50.000,00€	50.966,95€	966,95€
PROYECTO: TRACTORES AGRICOLAS	174.700,00€	14,52%	170.000,00€	14,05%	4.700,00€	170.000,00€	174.700,00€	4.700,00€			0,00€
PROYECTO: PROYECTO I+D MEJORA VARIETAL	66.929,96€	5,56%	70.000,00€	5,79%	-3.070,04 €	35.000,00€	33.464,98€	-1.535,02 €	35.000,00 €	33.464,98€	-1.535,02 €
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA CARTAYA	20.499,46€	1,70%	15.900,00€	1,31%	4.599,46 €	13.000,00€	16.525,25€	3.525,25€	2.900,00€	3.974,21€	1.074,21 €
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA MOGUER	26,430,71 €	2,20%	22,000,00€	1,82%	4.430,71 €	15.000,00€	16.498,43 €	1.498,43 €	7.000,00 €	9.932,28€	2.932,28€
PROYECTO, MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA MONTEMAYOR	19.429,39€	1,62%	17.000,00 €	1,40%	2.429,39 €	14.000,00€	15.233,14€	1.233,14 €	3.000,00€	4.196,25€	1.196,25 €
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA ROCIANA	29.099,32.€	2,42%	23.000,00€	1,90%	6.099,32 €	13.000,00€	16.325,00€	3.325,00€	10.000,00€	12.774,32€	2.774,32€
PROYECTO: MEJORAS ALOJAMIENTOS FINCA LUCENA	2.541,12 €	0,21%	1.700,00€	0,14%	841,12 €	1.700,00€	2.541,12 €	841,12 €	0,00€	0,00€	0,00€
TOTAL INVERSIONES PRODUCTIVAS FINCAS	594.279,41 €	49,40%	607.500,00€	50,21%	-13.220,59€	137.500,00€	134.683,76 €	-2.816,24€	470.000,00€	459.595,65 €	-10.404,35 €
TOTAL OTRAS INVERSIONES PRODUCTIVAS GENERALES	443.790,63 €	36,89%	460.000,00€	38,02%	-16.209,37 €	360.000,00€	342.879,90€	-17.120,10€	100.000,00 €	100.910,74€	910,74€
TOTAL INVERSIONES I+D	66.929,96 €	5,56%	70.000,00€	5,79%	-3.070,04€	35.000,00€	33.464,98 €	-1.535,02 €	35.000,00 €	33.464,98 €	-1.535,02 €
TOTAL INVERSIONES SOCIALES	98.000,00€	8,15%	79.600,00€	6,58%	18.400,00€	56,700,00€	67.122,94€	10.422,94 €	22.900,00€	30,877,06 €	7.977,06 €
TOTAL	1.203.000,00 €	100,00%	1.217.100,00 €	100,59%	-14.100,00€	589.200,00 €	578.151,57 €	-11.048,43 €	627.900,00 €	624.848,43 €	-3.051,57 €

Huelva a 31 de Julio de 2.020

**JAVIER VELO PRIETO** 

Director General

DANIEL VELO PRIETO

Director de Administración y Finanzas
